


杭基礎・フーチング形式






●進捗状況


下部工：32基着手／全45基
基礎杭工：24基完了／全40基
フーチング工：3基完了／全40基
RC橋脚工：2基完了／全8基
ケーソン基礎工：－／全7基

凡例


■：下部工完成
■：下部工施工中

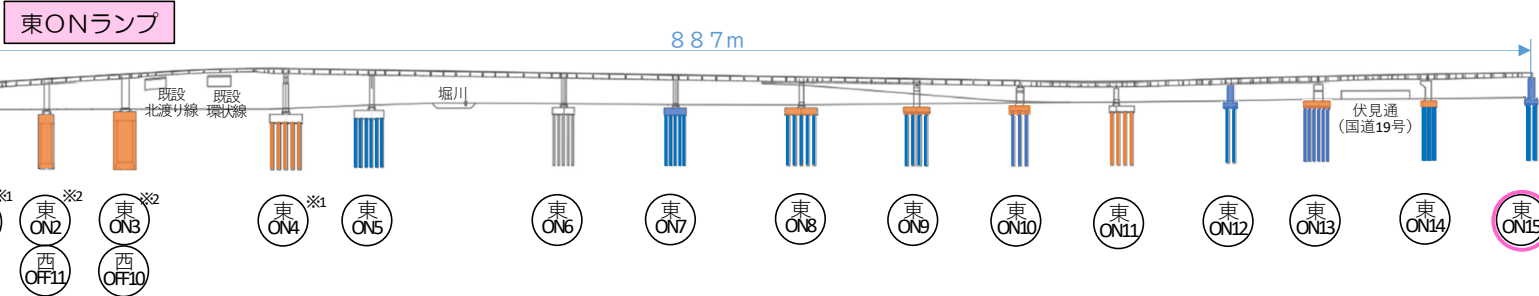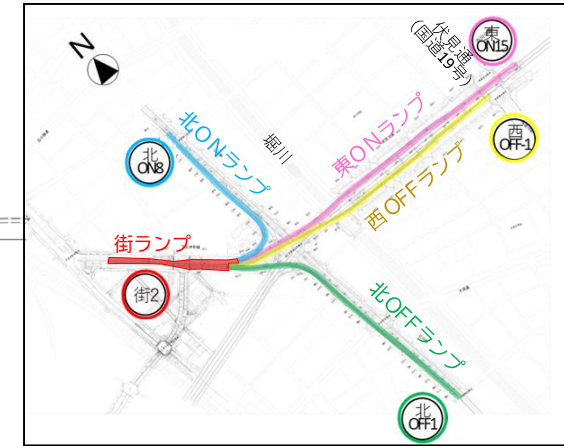


※1
ON・OFFランプ 両方の上部工を支えるT型構造の橋脚
東ON1と西OFF12,
東ON4と西OFF9,
の橋脚は兼用（基礎は2基）



西OFFランプ

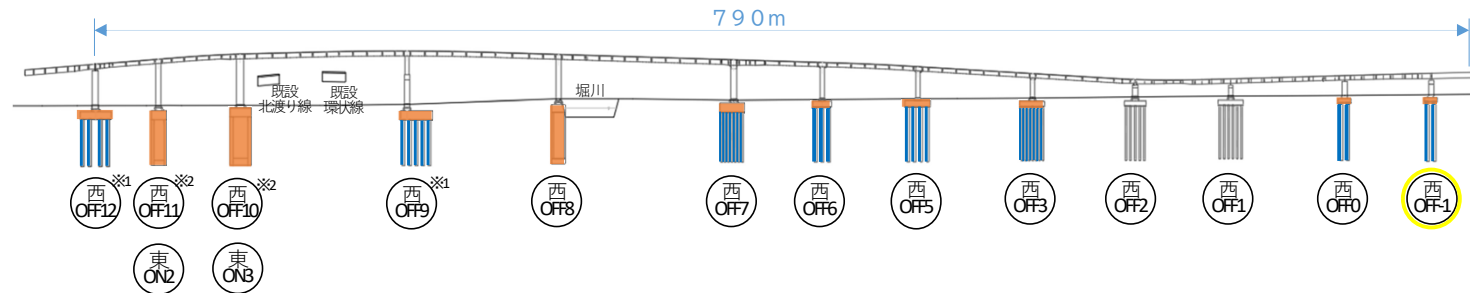

※2
ON・OFFランプ 両方の上部工を支える単柱構造の橋脚
東ON2と西OFF11,
東ON3と西OFF10
の橋脚は兼用



北OFFランプ

