


工事進捗報告　市道高速１号新洲崎工区改築事業（工事）　令和８年１０月２０日 時点

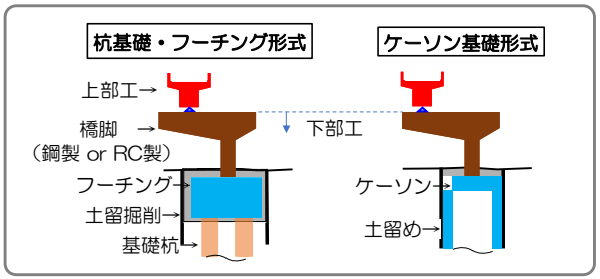


凡例
：下部工完成
：下部工施工中


●進捗状況
下部工　：３４基着手／全45基
基礎杭工：２６基完了　／全40基
フーチング工：４基完了／全40基
RC橋脚工：2基完了／全8基
ケーソン基礎工：ー／全７基

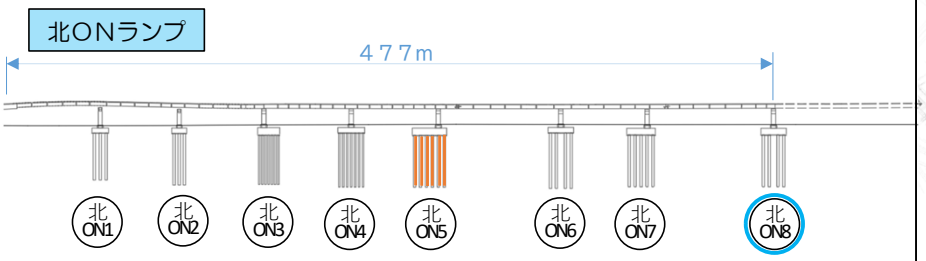


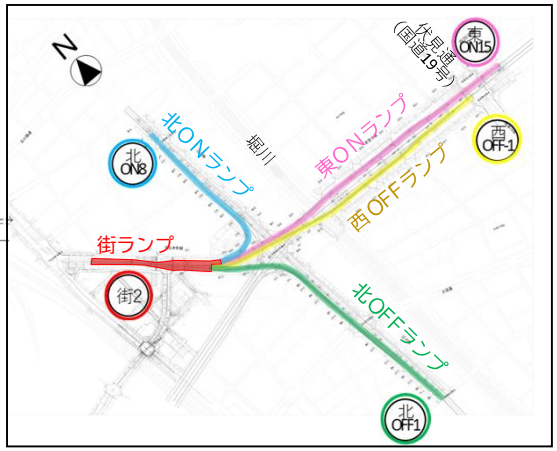

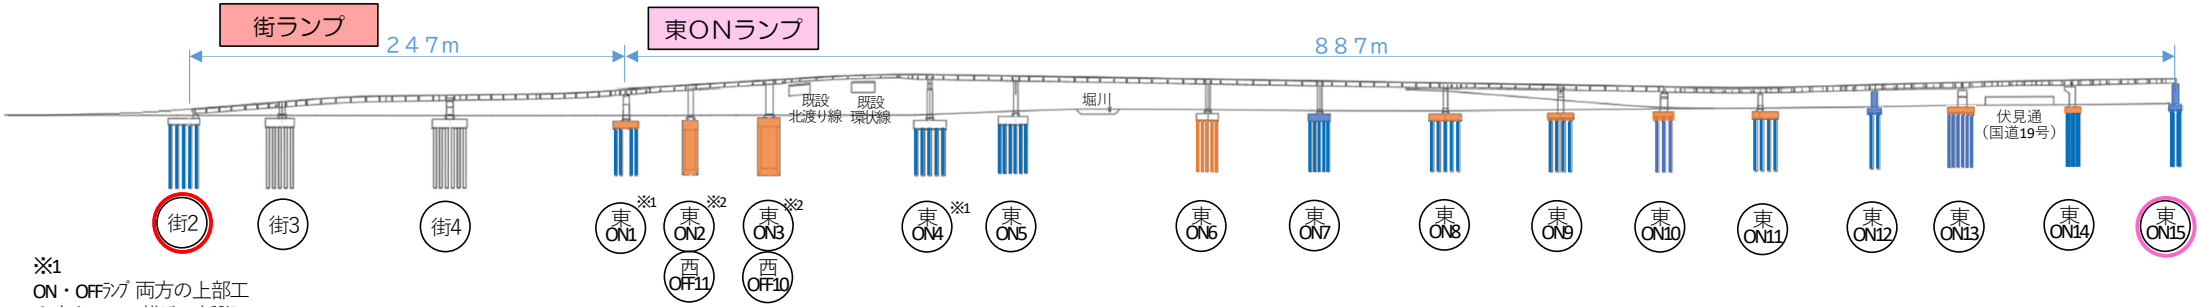



※1
ON・OFFﾗﾝﾌﾟ 両方の上部工を支えるﾗｰﾒﾝ構造の橋脚
東ON1と西OFF12,
東ON4と西OFF9,
の橋脚は兼用（基礎は2基）



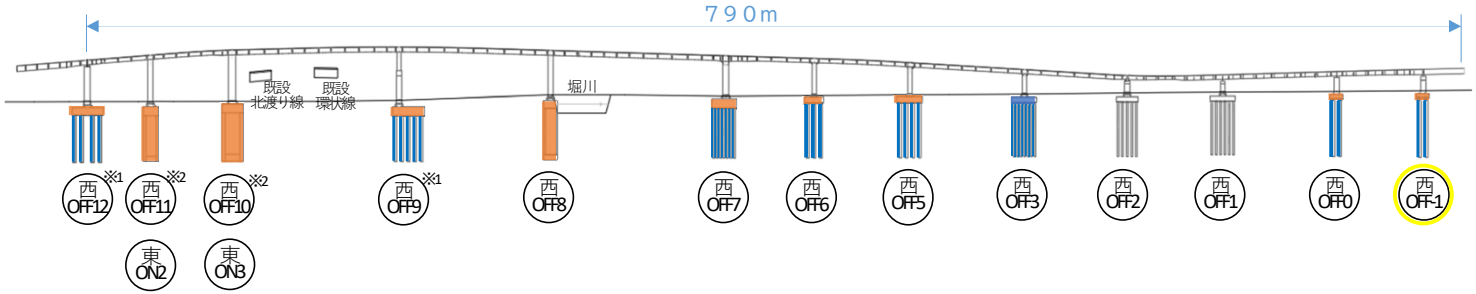

※2
ON・OFFﾗﾝﾌﾟ 両方の上部工を支える単柱構造の橋脚
東ON2と西OFF11,
東ON3と西OFF10
の橋脚・基礎は兼用





施工者	大林･大豊･矢作･川田･MMB･宮地･瀧上･駒ﾙ　市道高速１号他新洲崎工区改築事業 異工種共同企業体	担当課	都心アクセス事業部　都心アクセス工事第一課
